



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020


GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 008/ 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	18.735.600	
				2. VALOR ADICION	0	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA		3. VALOR TOTAL (1+2)	18.735.600		
NIT O CC:	4,413,512		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0		
CDP (#, rubro y fecha)	00361 DE 2022/01/25,	RUBRO	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.735.600		
RP (#, rubro y fecha)	000515 de 2022/03/07,	RUBRO	6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0		
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION ANSERMA – RISARALDA SECTOR AGUA BONITA					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS	
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				X		
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.				N/A		
3- Pagos al FIC				X		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X		
5- Informe de actividades o Bitácora.				X		
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.				X		
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20				X		
8- Ensayos de densidad.				N/A		
9- Diseño de Mezclas.				N/A		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.				N/A		
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)				X		
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51				N/A		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)				N/A		
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)				X		
15- Acta parcial o final del contrato.				X		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X


Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
--------	----------------	-------

  
D.O. PATTY  
10 - 05 - 2022  
A. SI

**DETALLE PLANILLA**  
**OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	Pagada
Identificación: CC-4413512	
Código dependencia o sucursal: 0	
Nombre dependencia o sucursal: 0	
Fecha de generación del reporte: 2022-04-07	
Fecha límite de pago: 2022-04-05	
Fecha de pago: 2022-04-04	
Pagada por: BANCOLOMBIA	
Período pensión: 2022-03	
Período salud: 2022-04 ✓	
Referencia de pago (PIN):	
Tipo de planilla: E	
Clase de planilla: Normal	
Número de la planilla: 22998690	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$379.200	\$379.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$379.200	\$379.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	
CCF11	890806490	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$733.800	\$733.800	

[Imprimir](#) | [Descargar Resumen](#)

**ASOPAGOS**  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 22998690  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2022-04-04

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN

PERÍODO COTIZACIÓN SALUD

FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2022	Mes: 03	Año: 2022	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.370.000	Nro. DE RADICACIÓN 22998690

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario	
Identificación	Vinculación	Sub tip o Cot.	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-15990720	01	No	No	No	17	174	Fijo	TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO				\$1.000.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID				\$1.370.000

NOVEDADES											Salario	
Identificación	I N G	R E T	T E P P	T E P P	V S Nov	V S Nov	V S Nov	I G E	L I G E	A V C	A V C	
CC - 15990720					\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0
CC - 1054996263					\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS	
Identificación	EPS	Días Cotizadas	IBC Pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistencia	Fondo Sol	Irregular no ret
CC - 15990720	PORVENTIR	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENTIR	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	\$0	\$54.800	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co	IBC Riesgos	C5 d CT
CC - 15990720	SALUD TOTAL	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	17
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	17

APORTES PARA FISCALES													
Identificación	CCP	Días Cot a CCP	IBC Cajas CCP	Tarifa CCP	Aporte CCP	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-15990720	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

**TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 03**

ADMINISTRADO RA PORVENTIR	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
							DÍAS MORA			
2	\$379.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$379.200

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC. LMA	VLR LMA	NETO DÍAS MORA	VLR INTERESE SES COT	VLR SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN PERIOD O Q INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O O R OBL	SALDO FAVOR PERIOD O O R OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR	
SALUD	2	\$94.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$94.80	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$94.80	\$0	\$0	\$94.80	\$0
TOTAL	2	\$94.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$94.80	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$94.80	\$0	\$0	\$94.80	\$0

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESSIONA LES	TOTAL PAGAR	FONDO SOL RIESGOS PROFESSIONA LES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	2	\$165.000	0	\$0	\$0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$0	\$0

**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	VALOR
CCF DE CALDAS	2	\$94.800	0	\$0	\$94.800	\$94.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
MInEdú	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

**TOTAL A PAGAR**

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$94.800
PENSIONES	1	\$379.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$165.000

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$94.800	\$94.800
SENA	1	\$0	\$0
ICBF	1	\$0	\$0
ESAP	1	\$0	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	\$0
GRAN TOTAL	1	\$733.800	\$733.800

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio	Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP \$ 50,000.00
-------------	----------	--------------	----------------	----------------------	---	--------------	------------------

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado

\$ 50,000.00

Dirección IP: 186.83.184.43

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Usuario Pagador: 4413512

Razón Social: SENIA

NIT	899999034	BANCOLOMBIA	74801106	1404142382	07/04/2022	No. Autorización/CUS	FechayHora
-----	-----------	-------------	----------	------------	------------	----------------------	------------

COMPROBANTE

4413512	Número de Identificación	VALLEJO
HERNANDO ANTONIO	Primer Apellido (si es Persona natural)	Dígito de Verificación (Si es persona natural)
03	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Naturalización Jurídica	Dirección de Domicilio	CARRERA 7 N°. 6 - 27
03	Ciudad Capital	Localización
1700100	Teléfono de Contacto	+57,314 8446597
MANIZALES	Código SIIF	3-2-07-1-02-1-04-43
36-02-00-017-000000	Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
008	Número Contrato de Obra	CONDUCCIÓN ANSERMA RISARALDA
008	Fecha Inicio Obra	Fecha Terminación Obra
11/03/2022	11/03/2022	26/03/2022
4413512	Ciudad de Ejecución de la Obra	4413512
11/03/2022	Fecha Inicio Obra	Fecha Terminación Obra
008	Número Contrato de Obra	008
008	Nombre Obra	CONDUCCIÓN ANSERMA RISARALDA
008	Fecha Terminación Obra	26/03/2022
01	Tipo FIC	Mes Periodo a Pagar
3	01	3
2022	Año Periodo a Pagar	2022
4413512	Ciudad de Ejecución de la Obra	4413512
11/03/2022	Fecha Inicio Obra	11/03/2022
008	Número Contrato de Obra	008
008	Nombre Obra	CONDUCCIÓN ANSERMA RISARALDA
008	Fecha Terminación Obra	26/03/2022
01	Tipo FIC	01
3	01	3
2022	Año Periodo a Pagar	2022
18735600.00	Costo Total Mano de Obra	18735600.00
2	Número de Trabajadores en el Período	2
50000.00	Aporte FIC	50000.00
50000.00	Apporte del Pago	50000.00
50000.00	Valor del Pago	50000.00
0.00	Aporte SENAI	0.00
0.00	Valor Intereses Moratorios	0.00
0.00	Total	0.00

**899999034** BANCOLOMBIA 1404142382 07/04/2022  
NIT No. Transacción/CU\$ Fecha Hora  
Medio de Pago No. Transacción  
74801106

ACTO 008 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION  
ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA

Observaciones:

Transferencia

Condicionales de Pago:

Total Bruto	18.603.707.00	IVA 19%	131.891.92	Dilectos señores setecientos treinta y cinco mil quinientos noventa y ocho pesos m/c te con noventa y dos cent.
Total a Pagar	18.735.598.92	Vigencia: 6 Meses	18.735.598.92	A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con efecto Comprador deberá haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título - Valor: Número Autorización 1876402673083 probado en 20220308 por medio FE desde el número 45 al 150

Total items: 4

Item	Costo Directo	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO			
2	ADMINISTRACION		13.883.364.00	13.883.364.00
3	IMPREVIOS		3.332.007.00	3.332.007.00
4	UTILIDADES		694.168.00	694.168.00

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANTARÍAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESIÓN ABREVIA DA EMPICAL	Fechay hora Factura	02/05/2022, 15:14	Generación	036 8867080	Teléfono	CR 23 75 82	dirección	CR 803.299-9

Nombre	NIT 44135127	HERREA	CR 10 2 13	Tel: (036) 3116138675	Chinchina - Colombia	Expedición	09/05/2022, 15:23	Manizales - Colombia	CR 23 75 82	dirección	CR 803.299-9



No. FE-51  
Factura electrónica de venta

NIT 44135127  
HERREA  
CR 10 2 13  
Tel: (036) 3116138675  
Chinchina - Colombia  
claudia3032@hotmail.com

**FUSION HV**

MARZO DE 2022

MANIZALES, CALDAS

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

SUPERVISOR

AGUA BONITA".

ACTO 008 DE 2022 "REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION ANSERMA - RISARALDA SECTOR

HERNANDO VALLEJO

CONTRATISTA



EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

CONTRATANTE

INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL

A continuación, un resumen del estado en el que se entregó el contrato terminado en su totalidad.

Intervendrá, transportará de la tubería desde China a Risaralda, excavaciones a cielo abierto, instalación de tubería y empalme, llenos y construcción de soportes e instalación portafunciones en empalmes.

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRÁFICO INCLUIDO:

Municipio de RISARALDA CALDAS.

### 1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

"REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA", EN RISARALDA CALDAS.

### 1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Objeto:	ACTO 008 DE 2022	Número del contrato
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERERA	RISARALDA SECTOR AGUA BONITA
Fecha del Acto:	07 de marzo de 2022	Plazo de ejecución:
Valor Total:	\$18.735.600	Fecha de iniciación:
Fecha de suspensión:	Marzo 11 DE 2022	Fecha de reanudación:
Fecha de finalización:	Marzo 26 DE 2022	Fecha de terminación:
Fechas de ejecución:	N/A	Adición (en valor):
Plazo de ejecución:	20 días calendario	Proyecto (en tiempo):
Valor Total:	\$18.735.600	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	

### 1.1 FICHA TÉCNICA

VALLEJO en el periodo comprendido entre el 11 de MARZO - 26 de MARZO de 2022, en el marco de la ejecución del acto 008 de 2022 por emergencia cuyo objeto es "REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA".

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el contratista de Obra HERNANDO

COSTO TOTAL OBRA	18.735.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	18.735.600
SALDO POR EJECUTAR	0

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES			
2	Localización y replanteo	ml	120	801.600
3	Excavaciones	ml		
4	Excavaciones en zanja - material columnar 0 a 2 m	M3	72	2.016.000
5	Rellenados compactos con material seleccionado de excavación	M3	66	1.188.000
6	Dispersión de material sobrante	M3	6	90.000
7	ACUEDUCTO			
8	Empalmes de polietileno a PVC en 10"	Und	2	2.200.000
9	Instalación de tubería de 10" polietileno por termofusión	M1	120	7.200.000
10	Sobre acarreo de tubería aprox 100 mts	GI	1	1.000.000
11	Termo fusión de portaflanche de 10"	Und	2	600.000
12	Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2". De diámetro con tortones de alambre galv. Cal 13.	Und	2	700.000
13	Transporte de tubería y accesorios desde Chinchina hasta el sitio de la obra en Risaralda caldas.	Viaje	1	700.000
14	Transporte de personal al sitio.	Día	8	2.240.000
	COSTO TOTAL (INCCLUYE A.I.U.)			18.735.600


OBJETO : "REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA".




## 2. EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONCLOMERADO A CIELO ABIERTO



## 1. TRANSPORTES

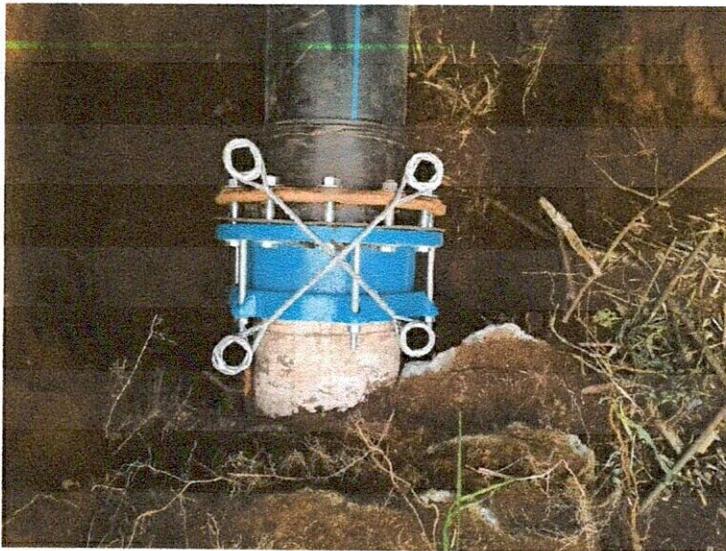


4. EMPALMES Y ANCIAJES

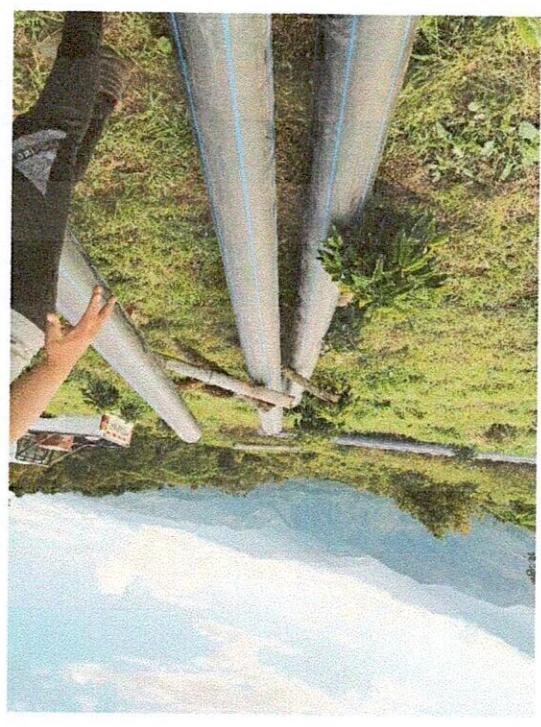


3. TERMOFUSIÓN Y EMPALME

WLR

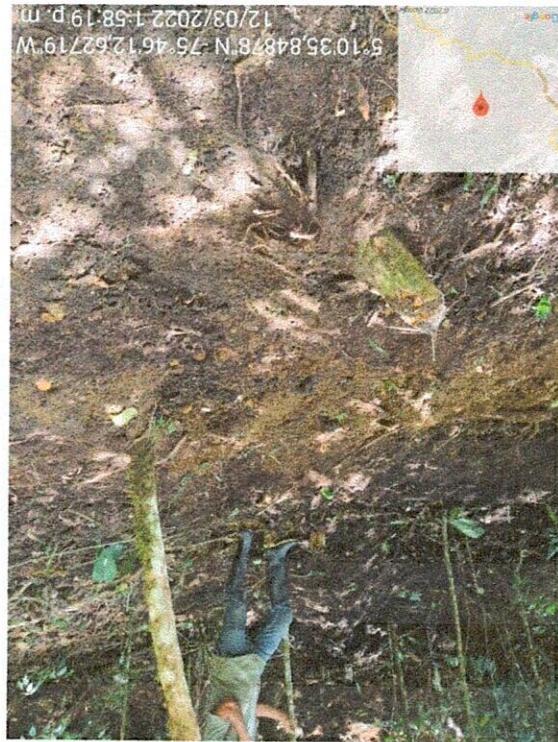

#### 6. DISPERSIÓN DE MATERIAL SOBRANTE

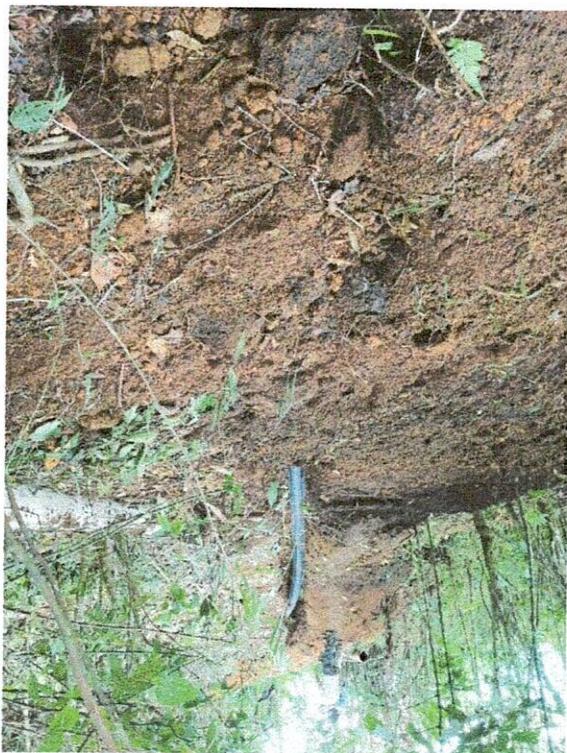

#### 5. LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE OBRA

En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA", EN RISARALDA CALDAS.

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Jóhann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.

HERNANDO VALLEJO

COTRATISTA  
4.413.512  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERREIRA



Plazo de ejecución:	20 DIAS	Tiempo total transcurrido:	15 DIAS	Avance Procentual:	75%
---------------------	---------	----------------------------	---------	--------------------	-----

### 1.3. AVANCE EN TIEMPO

INSTALACION DE TUBERIA	SERVICIO	KILOMETROS	ACUEDUCTO	RISARALDA
------------------------	----------	------------	-----------	-----------

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

AVANCE FÍSICO DEL PERÍODO	100%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	100%
---------------------------	------	-------------------------	------

#### 1.1. AVANCE FÍSICO

### 1. AVANCE DEL CONTRATO

Número del contrato	ACTO 008 DE 2022	Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN ANSERMA - RISARALDA SECTOR AGUA BONITA	Nombre Contratista:	HERNANDO ANTÓNIO VALLEJO HERRERA	Fecha del Acto :	07 de marzo de 2022	Plazo de ejecución:	20 días calendario	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reanudación:	N/A	Fecha de terminación:	Marzo 26 DE 2022	Adición (en valor):	N/A	Prorogas (en tiempo):	N/A	Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
---------------------	------------------	---------	---	---------------------	----------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	------------------	---------------------	-----	-----------------------	-----	------------------------------	-------------------------------

Informe	01	Fecha del	Informe	2022	Acta parcial	Acta final	X
---------	----	-----------	---------	------	--------------	------------	---

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	
		F-GC-20	Junio 2019 Versión 3
			

ACTIVIDADES.

NATURAL Y DE 2 PERSONAS DE PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTARON LAS 2022 SE ADJUNTAN AL ACTA DE PAGO PARCIAL Y LIQUIDACION, DE PERSONA PRESENTE PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE

### 3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	x	x	x	
Tanagarije escobar ruben dario		x	x	x			
Vallejo giraldo juan davíd							

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique affiliación o pagos aportados y señale con una X)

Inversión Contratada:	18.735.600	Inversión ejecutada en el periodo:	18.735.600	Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %	Inversión total ejecutada:	18.735.600	Porcentaje total ejecutado:	100 %
-----------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------	-------	----------------------------	------------	-----------------------------	-------

### 1.6. Advance financiero

El transporte, tránsito de material e ingreso de personal debió hacerse por medio privado, pero también se obtuvo el permiso verbal para el ingreso de trabajadores.

Adicionalmente se encontraron muchas grietas en terreno las cuales posiblemente al sumarse la alta pluviosidad ocasionaron la superficie de falla que terminó tensiándose la tubería y averiándola de manera longitudinal, lo que ocasionalmente daña que desencadenó finalmente en sobreestimación del terreno y un derribo en el sector aguas bonitas que afectó hasta el momento 3 fincas.

Los permisos que debía otorgar los dueños de los 2 predios por donde habla que realizar el nuevo desvío de la tubería para evitar la falla en el terreno que ocasionalmente daña de la red de tubería, se demoró desde el 7 de marzo hasta el 11 de marzo que se pudo dar inicio a las actividades.

### 1.5. Problemáticas con la obra.

### SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE INFORME

#### 1.4. Registro fotográfico

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
F-GC-20	Version 3 Junio 2019 Centro Universitario de Bachillerato <b>empociales</b>

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES			
2	Localización y replanteo	ml	120	801.600
3	EXCAVACIONES			
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	M3	72	2.016.000
5	Excavación excavación	M3	66	1.188.000
6	Dispersión de material sobrante	M3	6	90.000
7	ACUEDUCTO			
8	Empalmes de polietileno a PVC en 10"	Und	2	2.200.000
9	Instalación de tubería de 10" polietileno por termofusión	Ml	120	7.200.000
10	Sobre accarreo de tubería aprox 100 mts	Gl	1	1.000.000

SECTOR AGUA BONITA .

OBJETO : "REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION ANSERMA - RISARALDA

SE ADJUNTA ACTA PARCIAL 01 Y FINAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

5. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

Conveniciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								
		A	N/A	CASCO				
		N/A	OVEROL					
		A	A					
		N/A	BOTAS					
		N/A	CARNET					
		N/A	CHALECO					
		N/A	SEÑALIZACIÓN					
	Fecha de inspección							

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	
		F-GC-20	versión 3 Junio 2019
			

Personal Contratista de Construcción		Local	Extrema	Subtotal
Mano de Obra Clasificada	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
Mano de Obra No Clasificada	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
TOTALES	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
Personal Interventoria		Local	Extrema	Subtotal
Mano de Obra Clasificada	Indigencias	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
Mano de Obra No Clasificada		Local	Extrema	Subtotal
TOTALES	Indigencias	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0
	Negritud es	0	0	0
	Indigencias	0	0	0
	Madrés cabecera de familia	0	0	0

6.1. EMPLEOS GENERADOS

## 6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

COSTO TOTAL OBRA	18.735.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	18.735.600
SALDO POR EJECUTAR	0

# GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

Calificación entre 4 de la obra: Excelente 4 - Buena 3 - Regular 2 - Mala 1	4
---	---

DOCUMENTO	SI / N/A	X	Memoira de calculo de cantidades de obra a pagar
Bilacora de la obra	X	X	Relación de todos los domiciliarios que se resguardan en donde se incluye el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.
Paz y Salvo oficial de trabajo.	X	X	Paz y Salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscalias de los trabajadores a cargo en la obra.
Actuación de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	X	Actuación de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.
Ensayos de laboratorio	X	X	Acta de suspensión y renuncia (Con la respectiva justificación)
Plan de manejo ambiental	X	X	Acta de convenio de precios
Acta de veeduría	X	X	Acta de veeduría
Acta de entorno	X	X	Acta de entorno
DOCUMENTO	SI / N/A	X	Bilacora de la obra

## 7. DOCUMENTOS ANEXOS

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA  
USUARIOS DEL ACUERDO REGIONAL DE OCCIDENTE DE LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR.

TOTALS	
Personal con limitaciones físicas	0 0 0
Indigenas	0 0 0
Negritudes	0 0 0
Maderas cabeca de familia	0 0 0
Mano de Obra No Calificada	0 0 0
Personal con limitaciones físicas	0 0 0

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	empocildes 



#### REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<small>Copyright © 2019 Empocaldes S.A.S. All rights reserved.</small> <b>empocaldes</b> 



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	
		F-GC-20	Junio 2019 Versión 3
		empoceldes controlando juntas de tierra	



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	
F-GC-20	versión 3	junio 2019	




GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
F-GC-20	Junio 2019 Versión 3
	Empocales www.empocales.com



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	
		F-GC-20	Junio 2019 Versión 3
<p align="center"><b>empocaledes</b></p> 			

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
		FGC-20 Versión 3 Junio 2019
 <small>Centro Universitario para la Desarrollista</small>		

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
NIT: 4-413.512  
NOMINA DEL 11 DE MARZO HASTA EL 26 DE MARZO 2022  
ACTA 008

*Acuerdo*

No	DOCUMENTO	Gastos de Personal	BASE	Dias	Salario	Auxilio	Devengado	Salud	Pension	NETO A PASAR	FIRMA		
	NOMBRES	APPELLIDOS	CARGO	SUELDO	VLR DIAS TRABAJADOS	TRABAJADOS	TRANSFOR TE	TOTAL	8.5%	4.0%	12.00%	4.00%	QUINCEÑAL
1	1054996283	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	16	730.687	56.775	787.442	-	29.227	-	29.227
2	15980720	RUBEN DARIO	TAMAGARIPE ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1.000.000	16	533.333	56.775	590.09	-	21.333	-	21.333
				<b>TOTAL</b>	<b>2.370.000</b>	<b>32</b>	<b>1.264.000</b>	<b>113.551</b>	<b>1.377.551</b>	<b>-</b>	<b>50.560</b>	<b>-</b>	<b>547.442</b>

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
NIT: 4-413.512  
EMPLEADOR

*Mel*

EMPOCALDAS S.A.E.S.P. - SERVICIO DE ACUEDUCTO

**F-AC-79**  
Version 01  
Marzo 2010

**EMPOCALDAS SA E S P - SERVICIO DE ACUEDUCTO**  
**TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO**

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

卷之三

०८

180

20

三

CONTRATO

CE  
X

008/2022

Pág. 1 De. 2

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

TOTAL FACTURA PAG-1

Fecha de presentación

## DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA 

Páginas

CONTINUA  
2

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	C.E. 008 DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 YFINAL	FEC. CORTE:	26 DE MARZO DE 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN ANSERMA RISARALDA - SECTOR AGUA BONITA	FECHA INICIACIÓN:	11 DE MARZO DE 2022	FEC. VENCIMIENTO:	31 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	PRORROGA:	N/A	VALOR ADICION:	N/A

SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL R.	FECHA:	26 DE MARZO DE 2022
-------------	--------------------------	--------	---------------------

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA	ACUMULADO	PRESENTE ACTA
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL			
1	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Localización y replanteo	m <sup>3</sup>	120.00	\$ 6.680	\$ 801.600	4.28%	120.00	\$ 801.600
3	<b>EXCAVACION</b>							
3.1	En material común de 0 a 2 m	m <sup>3</sup>	72.00	\$ 28.000	\$ 2.016.000	10.76%	72.00	\$ 2.016.000
3.2	Relevo compactos con material seleccionado de excavación	m <sup>3</sup>	66.00	\$ 18.000	\$ 1.168.000	6.34%	66.00	\$ 1.168.000
3.3	Dispersión de material sobrante	m <sup>3</sup>	6.00	\$ 15.000	\$ 90.000	0.48%	6.00	\$ 90.000,00
4	<b>ACUEDUCTO</b>							
4.1	Empalmes de polietileno a PVC en 10"	Un	2.00	\$ 1.100.000	\$ 2.200.000	11.74%	2.00	\$ 2.200.000
4.2	Instalación de tubería de 10" polietileno por termo fusión	m <sup>3</sup>	120.00	\$ 60.000	\$ 7.200.000	38.43%	120.00	\$ 7.200.000,00
4.3	Sobre acarrero de tubería de 10" aprox 100 mt	Gr	1.00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	3.29%	1.00	\$ 1.000.000
4.4	Tensiómetro de portafusible de 10"	Un	2.00	\$ 300.000	\$ 600.000	3.74%	2.00	\$ 600.000
4.5	Anclajes y tubería galvanizada de long 2 m de 2", de diámetro con tortones de alambre galvanizado cal 13	Un	2.00	\$ 350.000	\$ 700.000	3.74%	2.00	\$ 700.000,00
4.6	Transporte de tubería y accesorios desde chinchiná hasta el sitio de obra en Risaralda Caldaz	VIAJE	1.00	\$ 700.000	\$ 700.000	3.74%	1.00	\$ 700.000,00
4.7	Transporte de personal al sitio	Día	8.00	\$ 280.000	\$ 2.240.000	11.96%	8.00	\$ 2.240.000,00
	<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>			\$ 18.735.600			\$ 18.735.600	
	<b>COSTO DIRECTO</b>							
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>			\$ 13.983.364			\$ 13.983.364	
	IMPREVISTOS		2%	\$ 3.320.008			\$ 3.320.008	
	UTILIDAD		5%	\$ 694.168			\$ 694.168	
	<b>SUMAS ANTES DE IVA</b>			\$ 694.168			\$ 694.168	
	IVA Sobre utilidades		19%	\$ 18.603.708			\$ 18.603.708	
	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>			\$ 131.892			\$ 131.892	
	<b>TOTAL ACTA 01 Y FINAL</b>			\$ 18.735.600			\$ 18.735.600	

SON: CATORCE MILLCENOS QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ACTA 01

VALOR EJECUTOR:

SUMAS IGUALES

\$ 18.735.600

\$ 18.735.600

\$ 18.735.600

\_\_\_\_\_  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista

V.O. B.P.: JOHANN MANUEL SABOGAL R.  
ING. ZONA OCCIDENTE  
SUPERVISOR

